

21	Экскаватор - погрузчик			0,00	32621,41	0,0	32621,41	-32621,41									
22	Гидромолот			0,00	1696,429	0,0	1696,429	-1696,429									
23	Узки ковш траншейный			0,00	339,286	0,0	339,286	-339,286									
24	Траншекопатель в комплекте			0,00	4285,714	0,0	4285,714	-4285,714									
	итога			400375	367939	400375	367939	32436		0	0			0	0	0	0

Продолжение Приложения № 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	нет		нет		

Директор АО "ПТВС"

Аманбаев Б.Ж.


4	Капитальный ремонт-хозпитьевого водопровода по ул.Сейфуллина от ул.Алашахана до ул.Гарышкерлер				0,0	2223,8	0,0	2223,8	-2 223,8								
5	Капитальный ремонт-хозпитьевого водопровода по ул.Сейфуллина от ул.Абая до ул.Гагарина				0,0	8738,1	0,0	8738,1	-8 738,1		0	0		0	0	0	0
6	Капитальный ремонт-хозпитьевого водопровода по ул.Абая в районе ПШ № 6				0,0	972	0,0	972	-972,0								
7	Капитальный ремонт-хозпитьевого водопровода по ул.Абая 128-130				0,0	606,68	0,0	606,68	-606,7								
8	Замена переходов х/п водопровода по ул.Желтоксан в районе насосной станции 2 теплая и столовой № 11				0,0	7084,4	0,0	7084,4	-7 084,4								
9	Капитальный ремонт-хозпитьевого водопровода по ул.Сейфуллина от ул.Абая до ул.Аманжолова				0,0	10558,1	0,0	10558,1	-10 558,1								
10	Капитальный ремонт-хозпитьевого водопровода по ул.Аманжолова от ул.Холмецкого до ул.Ультасукая				0,0	27202,44	0,0	27202,44	-27 202,4								

11	Капитальный ремонт-магистральных водопроводных сетей Старого Серверного водопровода по ул.Мира от ул.Гагарина до ул.Гарышкерлер				0,0	14876,93	0,0	14876,93	-14 876,9									
12	капитальный ремонт-усиление плит покрытий Хозпитеввых очистных сооружений				0,0	26875	0,0	26875	-26 875									
13	приобретение ОС:Автотранспорт Камаз КС-55732				0,0	29700	0,0	29700	-29 700									
14	приобретение ОС: Бортовой Камаз 53228-1990-15 с кран манипуляторной установкой				0,0	20446,43	0,0	20446,43	-20 446,43									
15	приобретение ОС: Тягач Камаз 65116-019 полуприцеп SCHMITZ				0,0	13392,86	0,0	13392,86	-13 392,86									
16	приобретение ОС: Весы лабораторные-2 шт				0,0	800	0,0	800	-800,00									
17	приобретение ОС: МФУ HP Laserjet PRO M426 fdn				0,0	516,88	0,0	516,88	-516,88									
18	приобретение ОС: Кондиционер настенный				0,0	300	0,0	300	-300,00									
19	Насос погружной приоз-ть 20-30 м3/ч в комплекте				0,0	75,89	0,0	75,89	-75,89									
20	Холодильник однокамерный витрина				0,0	171,43	0,0	171,43	-171,43									
21	Коммутатор сетевой				0,0	1183,92	0,0	1183,92	-1 183,92									
22	Источник бесперебойного питания				0,0	160,48	0,0	160,48	-160,48									
23	Точка доступа				0,0	124	0,0	124	-124,00									
	ИТОГО				596 732	490450	596 732	490450	106281									

Продолжение Приложения № 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной

монополии, их корректировки,
а также проведения анализа
информации об их исполнении

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года (полугодия) , предшеству ющего отчетному периоду	план (год)	факт текуще го года (полуго дня)	Оценка достижен ия показател ей эффектив ности, надежнос ти и качества	Причины (обоснова ние) недостиж ения показател ей эффектив ности, надежнос ти и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	нет		нет		



Директор АО "ПТВС"


Аманбаев Б.Ж.

8	Установка эл.двигателя сгорания поршневым с восп.от сжатия мощ. Не более 7,5 кВа			0	240	0,0	240,0	-240,0									
9	УАЗ -220695-460-04 (867АО 09)			0	5866,1	0,0	5866,1	-5866,1									
	итого		0	24464	23414	24464	23414	1050			0	0			0	0	0

Продолжение Приложения № 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	нет		нет		

Директор АО "ПТВС"

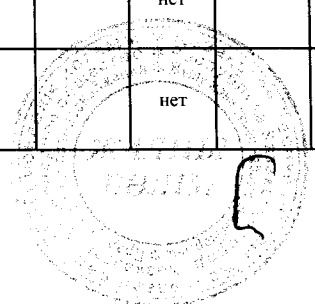

Аманбаев Б.Ж.

**Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
на ___2017___ год**

АО "Предприятие тепловодоснабжения" г.Жезказган услуги по отводу и очистке сточных вод

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности,

инвестиционная программа утверждена Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области № 243-ОД от 18.09.2015 года, согласована руководителем ГУ "Управление энергетики и ЖКХ по Карагандинской области" 21.10.2015 г

кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа)

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																			
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		собственные средства				Заемные средства				бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Капитальный ремонт канализационного коллектора от главной хозфекальной насосной станции до песколовок				92 314,6	96638,58	92 314,6	96638,6	-4 324,0			0	0			0	0	0	0
2	Приобретение ОС-илозаборник серии ИРВО-24 (в комплекте)				31 245,0	27600	31 245,0	27600	3 645,0			0	0			0	0	0	0
3	Приобретение ОС -илоскреб серии ИРПО (в комплекте)				31 877,0	27650	31 877,0	27650	4 227,0			0	0			0	0	0	0
4	Приобретение ОС -автомшины вакуум				15 292,00	20000	15 292,0	20000	-4 708,0			0	0			0	0	0	0
5	Насос марки СМ 250-200-400,401,402,403				8 163,00	5178,8	8 163,0	5178,8	2 984,2			0	0			0	0	0	0
	итого				178892	177067	178892	177067	1824			0	0			0	0	0	0

Продолжение Приложения № 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	нет		нет		
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	нет		нет		

Директор АО "ПТВС"

Аманбаев Б.Ж.

Размещено на сайте 30.05.2018 г.
